



ISA-202


**Rekayasa
Perangkat
Lunak**

TM-05 Project Management
– Introduction to Project
Management (2)

Selasa, 02/03/2021

Materi

- **Introduction to Project Management**
 - Project
 - Management
 - Manager
- **Project Management Process**
 - Initiating, Planning, Executing, Monitoring, dan Closing
- **Project Management Knowledge Area**
 - Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Risk, Human Resource, Communication, dan Procurement.

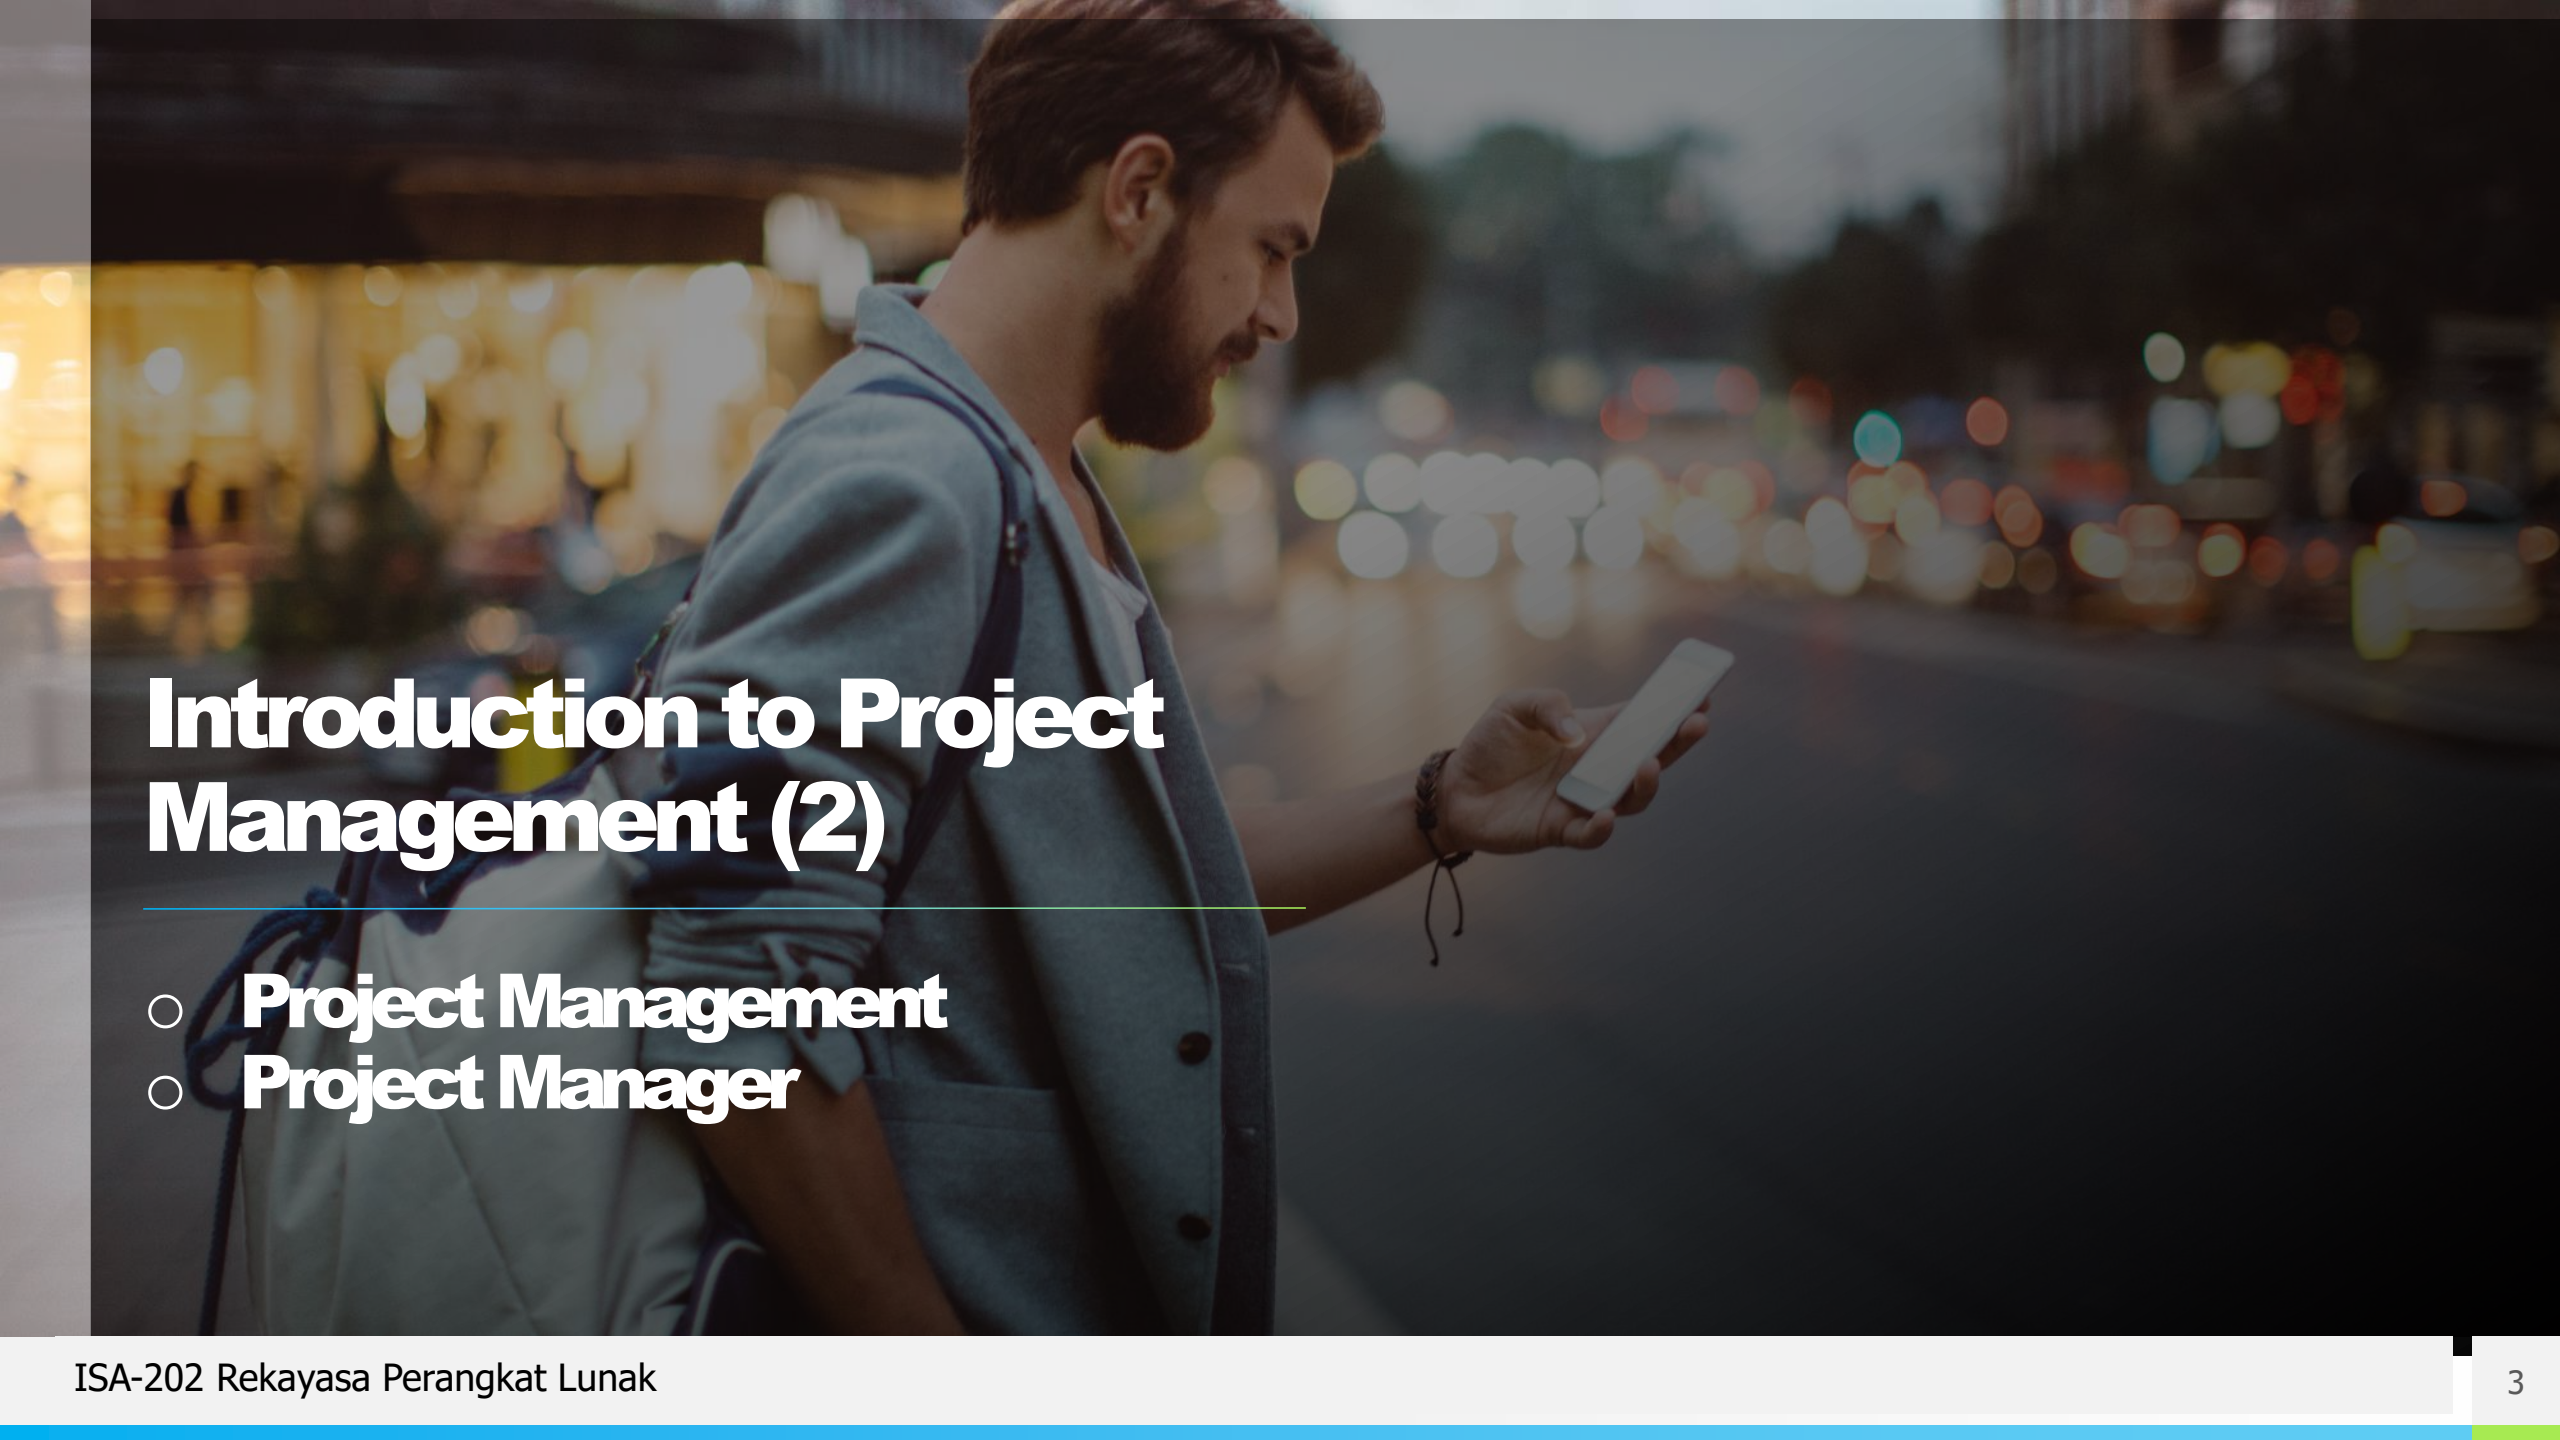A man with a beard and a backpack is looking at his smartphone on a city street at night. The background is blurred with city lights.

Introduction to Project Management (2)

- **Project Management**
- **Project Manager**

Project Management

Apa itu Manajemen Proyek ? (1) (IT Project Management)



- Manajemen Proyek adalah pengaplikasian **knowledge, skill, tools**, dan **techniques** pada aktivitas proyek untuk mencapai kebutuhan dan tujuan proyek.
- Pelaksanaan proyek tidak hanya memenuhi **scope, time, cost**, dan **quality** sebagai tujuan proyek, namun juga harus **memfasilitasi** seluruh proses untuk **memenuhi** harapan dari seluruh pihak yang terlibat (stakeholders).

Manajemen Proyek adalah proses yang mencakup **perencanaan, penerapan, pengukuran kinerja** serta **kemajuan proyek** (PMP Study Guide).

Stakeholder Proyek


- Sponsor proyek yaitu pemilik pekerjaan, pemberi tugas, dan pemberi pendanaan.
- Manajer proyek yaitu figur sentral yang bekerjasama dengan *stakeholder* lainnya.
- Tim proyek
- Staf pendukung
- Suplier
- Lingkungan
- Eksekutif

Masing-masing *stakeholder* memiliki interest (ketertarikan) berbeda-beda, sehingga kebutuhan mereka harus diperhatikan sejak awal proyek.

Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

- PMBOK adalah sebuah panduan yang berisi pengetahuan dalam manajemen proyek yang selalu diperbarui dalam jangka waktu tertentu.
- Isi dari PMBOK adalah:
 - Project Process
 - Knowledge Areas
- Project Process secara umum dibagi ke dalam 2 kategori:
 - **Project Management Process:** mendeskripsikan, mengorganisir, dan melengkapi pekerjaan dari proyek yang dapat diaplikasikan pada semua jenis proyek secara umum.
 - **Product-oriented Process:** menentukan dan membuat produk dari proyek.


Project Management Process (1)

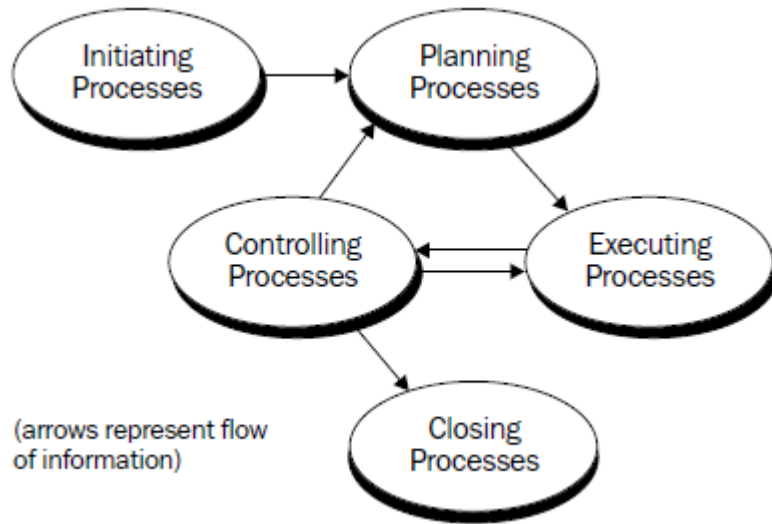

Proses manajemen proyek dapat dibagi menjadi 5 kelompok:

- **Initiating**: melakukan inisialisasi atau otorisasi proyek
- **Planning**: mendefinisikan tujuan dan memilih alternatif terbaik dalam mencapai tujuan tersebut.
- **Executing**: berkoordinasi dengan orang-orang dan sumber daya lainnya untuk menjalankan rencana.
- **Controlling**: memastikan bahwa tujuan proyek dipenuhi dengan cara mengontrol dan mengukur proses secara teratur, mengidentifikasi adanya penyimpangan dari rencana, kemudian melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan.
- **Closing**: melakukan penutupan proyek secara resmi atau serah terima proyek kepada customer.

Project Management Process (2)

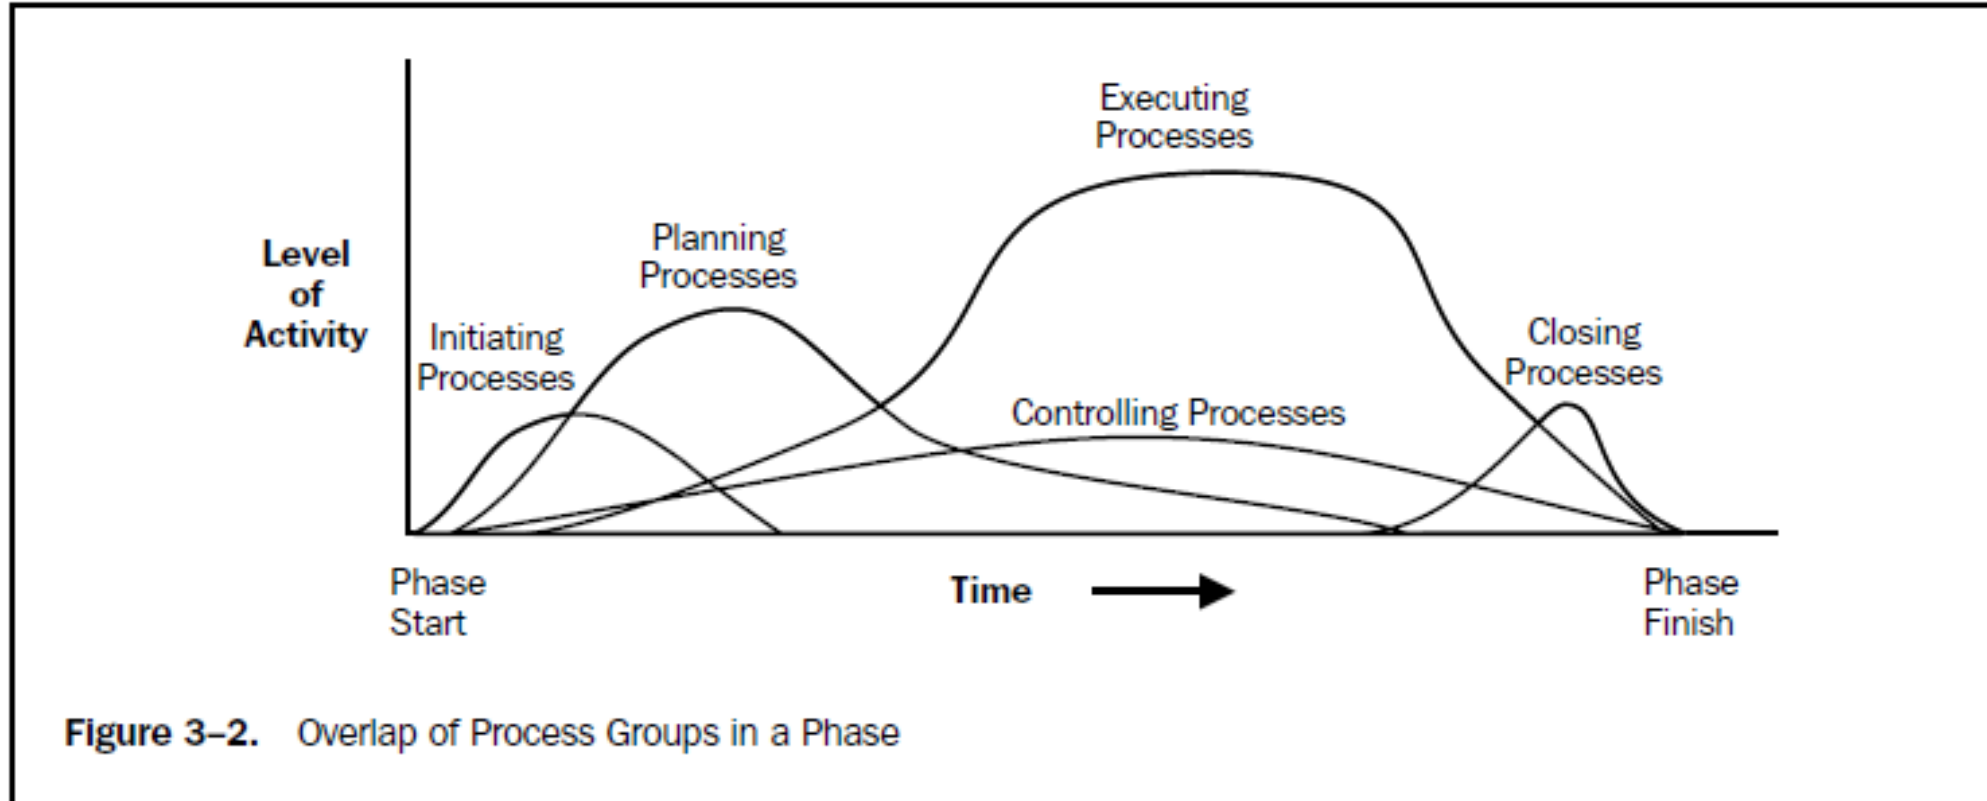

Keterkaitan Antar Fase pada Proses Manajemen Proyek (Overlapping Phase)

Project Management Knowledge Area (1)

Core Function

- **Project Scope Management**: mendeskripsikan proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses.
- **Project Time Management**: mendeskripsikan proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu.
- **Project Cost Management**: mendeskripsikan proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dengan biaya yang disetujui.
- **Project Quality Management**: mendeskripsikan proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek sesuai dengan kebutuhan kualitas.

Project Management Knowledge Area (2)


Facilitating Function

- **Project Human Resource Management**: mendeskripsikan proses yang dibutuhkan untuk membuat orang-orang bekerja lebih efektif di dalam proyek.
- **Project Communication Management**: mendeskripsikan proses yang dibutuhkan untuk memastikan pengumpulan dan penyebaran informasi tepat waktu dan sesuai.
- **Project Risk Management**: mendeskripsikan proses yang berkonsentrasi pada identifikasi, analisis, dan respon terhadap risiko proyek.
- **Project Procurement**: mendeskripsikan proses yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dari luar organisasi.

Overacting Function

- **Project Integration Management**: mendeskripsikan proses yang dibutuhkan untuk memastikan berbagai jenis elemen dari proyek dikoordinasikan dengan baik.

Project Management Framework

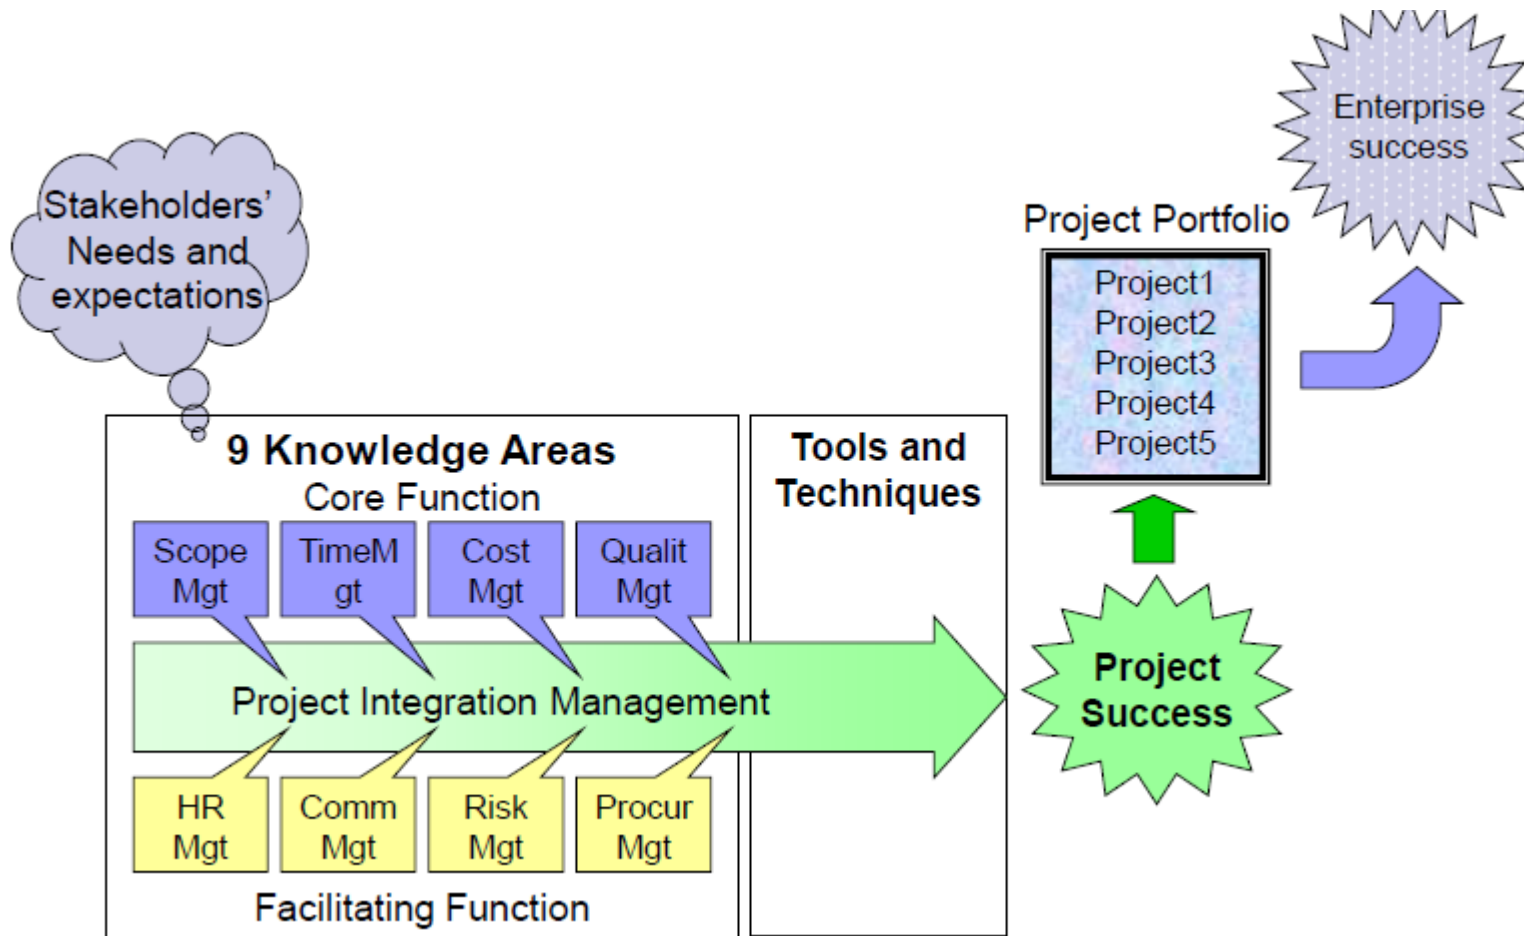

- **Project Management Tools and Techniques** membantu tim proyek dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang tercakup ke dalam 9 Knowledge Area. Contoh: *gant chart*, *project network diagram*, dan *critical path analysis*.
- **Project Portofolio Management** membantu untuk mengorganisir hasil pelaksanaan proyek sebagai portofolio yang selanjutnya akan menjadi investasi keberhasilan perusahaan.

Fungsi Pekerjaan Manajemen Proyek

- Mendefinisikan *scope* dari proyek
- Mengidentifikasi *stakeholder*, *decision maker*, dan prosedur eskalasi
- Membuat *Work Breakdown Structure* (WBS)
- Mengestimasi kebutuhan waktu
- Membuat prosedur atau *flowchart* persiapan manajemen proyek
- Mengidentifikasi kebutuhan terhadap sumber daya dan biaya
- Mengevaluasi kebutuhan proyek
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko
- Mempersiapkan *contingency plan*
- Mengidentifikasi interdependensi
- Mengidentifikasi *milestone* yang kritis (penting)
- Berpartisipasi dalam melakukan *review* terhadap proyek
- Mengamankan sumber daya yang dibutuhkan
- Mengelola proses pengendalian perubahan
- Membuat laporan status proyek

Faktor Keberhasilan Proyek

* User involvement	15.9%
Management support	13.9%
* Clear statement of requirements	13.0%
Proper planning	9.6%
* Realistic expectations	8.2%
Smaller milestones	7.7%
Competent staff	7.2%
* Ownership	5.3%

Standish Group 1995 & 1996

Scientific American, Sept. 1994

- Dukungan manajemen
- Keterlibatan user
- Project Manager yang berpengalaman
- Tujuan/sasaran bisnis yang jelas
- Scope (lingkup) yang fokus
- Menggunakan standar dalam penggunaan infrastruktur software
- Requirement yang jelas dan tegas
- Penggunaan metodologi yang formal
- Estimasi yang dapat dipercaya
- Kriteria lain seperti *small milestone*, *proper planning*, *competent staff*, dan *ownership*.

Project Manager

Project Manager (PM)

- PM adalah penanggungjawab langsung dan pemimpin pelaksanaan proyek
- Analogi lainnya dari seorang *project manager* adalah *conductor*, *coach*, atau *captain*.
- PM harus familiar dengan 9 Project Management Knowledge Area dan berbagai *tools* yang digunakan pada manajemen proyek.
- PM yang baik lebih mementingkan *keberhasilan* proyek.
- PM harus dekat dengan *stakeholder* lain, khususnya sponsor, tim proyek, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pencapaian tujuan proyek.

Skill Yang Disarankan Untuk PM

Disarankan mengikuti:

- *Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK)
- *9 Knowledge Area, Standard*, dan Regulasi
- Pengetahuan tentang lingkungan proyek
- Pengetahuan dan keterampilan manajemen secara umum
- *Soft skills* dan *human relation skills*
- Memahami organisasi tempat bekerja
- Nilai tambah: memahami topik-topik berkaitan dengan manajemen finansial, akuntansi, pengadaan, penjualan, pemasaran, kontrak dan produksi, distribusi, logistic, dll.

Karakteristik PM Yang Efektif

- *Lead by example* (memberi contoh)
- *Visioner* (memiliki pandangan jauh ke depan)
- Memiliki kompetensi teknis
- Tegas
- *Good communicators*
- *Good motivators*
- Berani menghadapi *top management* jika dibutuhkan
- Mendukung anggota tim
- Mendorong munculnya ide-ide baru.

Kemampuan Yang Harus Dimiliki PM

- *Communication Skills*
- *Organizational Skills*
- *Budgeting Skills*
- *Problem Solving Skills*
- *Negotiating and Influence Skills*
- *Leadership Skills*
- *Team Building and Human Resource Skills*



Thank You

👤 Kurnia Ramadhan Putra, S.Kom., M.T.

✉ kurniaramadhan@itenas.ac.id

🌐 https://www.researchgate.net/profile/Kurnia_Putra3
